

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

AUREA
INGEGNERIA^{srl}



INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE
Via Empedocle Restivo, 102 - 90144 Palermo
Tel. 091/754.10.28 - Fax 091/508.77.66
aureaingegneria@gmail.com

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI:
ING. GIACOMO ROBERTO

IL COMMITTENTE:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI ALTAVILLA MILICIA

L'IMPRESA:

PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE,
CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI DI MESSA
IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE (SETTORI 1 E 2) DI CUI AI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO
URBANO DI ALTAVILLA MILICIA

CRONOPROGRAMMA

(DIAGRAMMA DI GANTT)

TAV.

R. 07

SCALA DISEGNI:


DATA:

NOVEMBRE 2013

GANTT ALTAVILLA

F A S I		SOTTOFASE 1			
Descrizione	Importo totale	Inizio	Fine	Giorni	Giorni lav.
1.- OPERE MURARIE	22.487,68				
1.1.- Messa A Quota Dei Pozzetti	462,75	01/01/14	03/01/14	3	2
1.2.- Attraversamenti	15.703,60	15/01/14	08/02/14	25	18
1.3.- Nuovi Pozzetti	1.614,60	18/01/14	23/01/14	6	4
1.4.- Manutenzione Pozzetti	4.706,73	01/01/14	25/01/14	25	16
2.- OPERE ELETTRICHE	118.185,16				
2.1.- Messa In Opera Dei Cavi	81.590,77	12/01/14	20/03/14	68	49
2.2.- Posa Nuova Mensola E Nuovo Corpo Illuminante	13.288,85	12/02/14	26/02/14	15	11
2.3.- Quadri	7.023,45	18/03/14	27/03/14	10	8
2.4.- Manutenzione Mensole Esistenti	16.282,09	01/02/14	25/03/14	53	37
	140.672,84				

SETTIMANA	INIZIO	FINE	PRODUZIONE PARZIALE	PRODUZIONE TOTALE
1	01/01/14	05/01/14	1.404,10	1.404,10
2	06/01/14	12/01/14	2.517,75	3.921,84
3	13/01/14	19/01/14	13.395,85	17.317,70
4	20/01/14	26/01/14	15.002,07	32.319,77
5	27/01/14	02/02/14	13.410,48	45.730,25
6	03/02/14	09/02/14	14.318,38	60.048,63
7	10/02/14	16/02/14	14.979,13	75.027,76
8	17/02/14	23/02/14	16.750,98	91.778,74
9	24/02/14	02/03/14	13.207,28	104.986,02
10	03/03/14	09/03/14	10.549,51	115.535,54
11	10/03/14	16/03/14	10.549,51	126.085,05
12	17/03/14	23/03/14	11.163,99	137.249,04
13	24/03/14	30/03/14	3.423,80	140.672,84

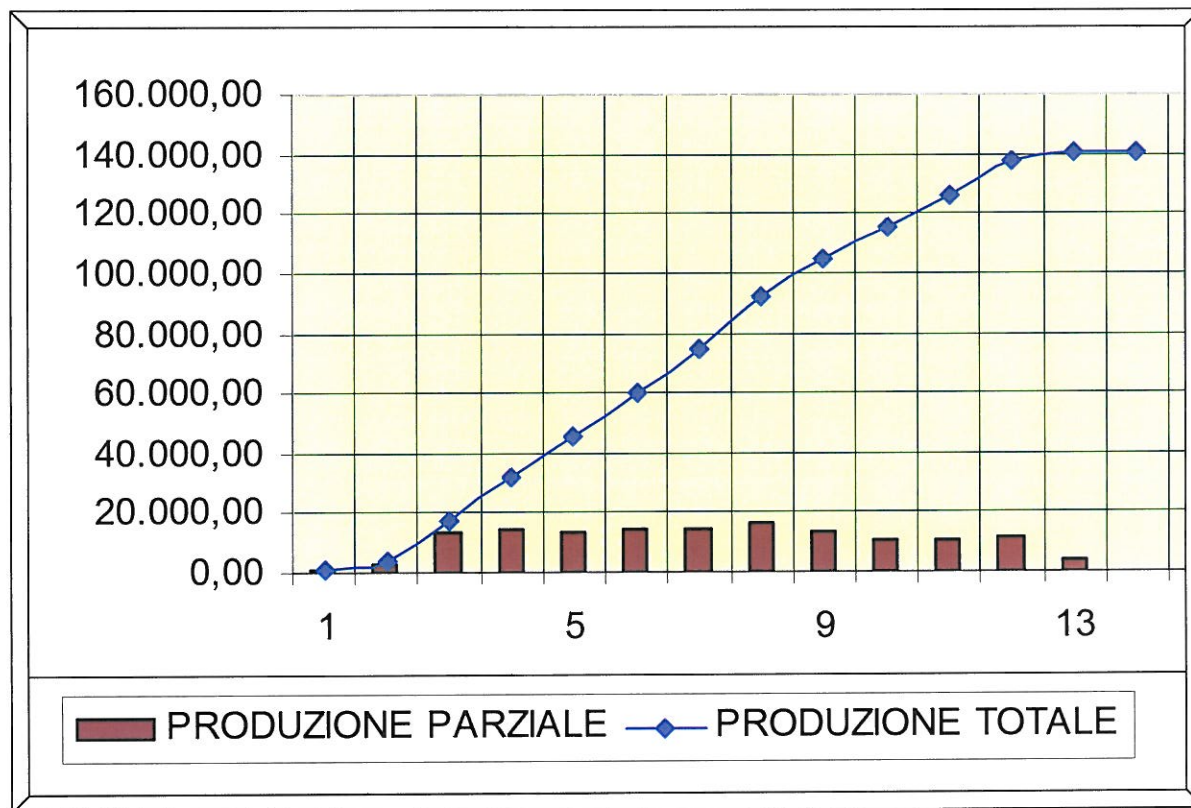

RIEPILOGO:Prev. 01/01/2014 - 27/03/2014 = 86 gg. Giorni lavorativi Prev.60 gg.

REPERILOGO - Prev. 01/01/2014 - 27/03/2014 - 66 gg. Giorni lavorativi Prev. 66 gg.					GENNAIO/14								FEBBRAIO/14								MARZO/14							
LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29		
1.- OPERE MURARIE	22.487,68																											
1.1.- Messa A Quota Dei Pozzetti	462,75	01/01/2014	03/01/2014	3	1	3																						
1.2.- Attraversamenti	15.703,60	15/01/2014	08/02/2014	25			15						8															
1.3.- Nuovi Pozzetti	1.614,60	18/01/2014	23/01/2014	6			18					23																
1.4.- Manutenzione Pozz.	4.706,73	01/01/2014	25/01/2014	25	1								25															
2.- OPERE ELETTRICHE	118.185,16																											
2.1.- Messa In Opera Dei Cavi	81.590,77	12/01/2014	20/03/2014	68			12																		20			
2.2.- Posa Nuova Mensola E Nuovo Corpo III.	13.288,85	12/02/2014	26/02/2014	15										12			26											
2.3.- Quadri	7.023,45	18/03/2014	27/03/2014	10																				18		27		
2.4.- Manutenzione Mensole Esistenti	16.282,09	01/02/2014	25/03/2014	53										1												25		
PARZIALI	-----				41.459,81								60.512,06								38.700,97							
PROGRESSIVI	-----				41.459,81								101.971,87								140.672,84							
MESE	-----				GENNAIO/14								FEBBRAIO/14								MARZO/14							
